

工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況(土木用)

工事名	受注者名	
項目	評価内容	備考
<input type="checkbox"/> 工事特性 工事全体を通じて他の類似工事に比べて施工困難等、工事特性への対応	<input type="checkbox"/> 施工規模	
	<input type="checkbox"/> 構造物固有	複雑な形状の構造物 既設構造物の補強、特殊な撤去工事
	<input type="checkbox"/> 自然・地盤条件	湧水、地下水の影響 軟弱地盤、支持地盤の状況 制約の厳しい工事用道路・作業スペース等 気象条件の影響 地滑り、急流河川、潮流等、動植物等
	<input type="checkbox"/> 周辺環境等,社会条件	埋設物等の地中内の作業障害物 鉄道・振動・水濁等環境対策 作業スペース制約・現道上の交通規制 廃棄物処理
	<input type="checkbox"/> 現場での対応	災害等での臨機の処理 施工状況(条件)の変化への対応
	<input type="checkbox"/> その他	
<input type="checkbox"/> 創意工夫 工事全体を通じて他の類似工事に比べて、特殊な工法、工夫	<input type="checkbox"/> 準備・後片付け	
	<input type="checkbox"/> 技術固有	特殊な工種及び工法 新工法(機器類を含む)及び新材料の適用
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工関係	施工に伴う機械、器具、工具、装置類 二次製品、代替製品の利用 施工方法の工夫 施工環境の改善 仮設計画の工夫 施工管理・品質向上の工夫
	<input type="checkbox"/> 品質関係	施工の検査・試験・記録に関する工夫
	<input type="checkbox"/> 安全衛生関係	安全施設・仮設備の配慮 安全教育・講習会・パトロールの工夫 作業環境の改善 交通事故防止の工夫
	<input type="checkbox"/> 施工管理関係	出来形・品質に関する工夫及び集計の工夫
	<input type="checkbox"/> その他	
<input type="checkbox"/> 社会性等 地域社会や住民に対する貢献	<input type="checkbox"/> 地域への貢献等	地域の自然環境保全、動植物の保護 現場環境の地域への調和 地域住民とのコミュニケーション ボランティアの実施

1. 該当する項目の□にレマーク記入

2. 具体的内容の説明として、写真・略図・ポンチ絵等を添え、説明資料として添付

工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況

可

工事名			
項目	工事特性・創意工夫・社会性等 のいずれかを記入	評価内容	施工関係
提案内容	仮設足場固定用に設置したアンカーの処理		

(説明)

仮設足場固定用に設置したあと施工アンカー本体を、足場解体時に撤去し、躯体の孔を無収縮モルタルにて補修し、品質向上を図る(NETIS登録番号:CB-170027-A)


(効果、実績)

アンカー本体の経年劣化によって生ずる、躯体のクラックや、アンカー本体の錆びダレの発生を防止
アンカー本体を撤去し、躯体の現状復旧を図る

計画

アンカー設置状況

撤去後

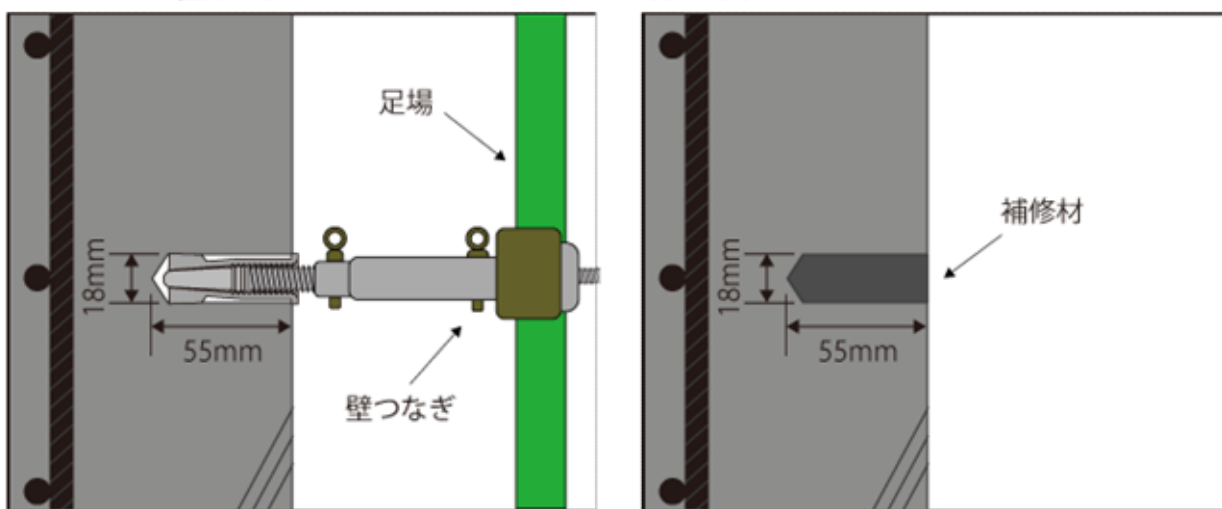

実施

説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

(注)本説明資料は公表する場合があります。なお、施工者として支障がある場合、「公表 否」と表示してください。
